

No	Uraian Kegiatan/ Pekerjaan	Pagu	HPS	Nilai Kontrak/Adendum	No./ Tanggal Kontrak & Adendum	Penyedia	Progres				Status	Keterangan
							Keuangan		Fisik			
							Realisasi	Bobot	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A Pelebaran Jalan Menuju Standar												
1	Pelebaran Jalan Menuju Standar di Ruas Padang Koto Gadang -Palembayan (P.088)			4.755.744.303,01	620/26/KTR-PGWS-BM/2022, 13/06/2022	PT. Aura Mandiri Sejahtera	951.148.860,60	20,00	4,149	4,324	Kontrak	
2	Pelebaran Jalan Menuju Standar di ruas Sp. Ganting Payo – Batas Tanah Datar – Sumani (P.092)			1.868.218.442,88	620/110/KTR-PGWS-BM/2022, 22/07/2022	PT. Dapindo Pratama	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontrak	
3	Pelebaran Jalan Menuju Standar di Ruas Padang Sawah -Kumpulan (P.068)			3.715.216.138,85	620/113/KTR-PGWS-BM/2022, 26/07/2022	PT. Aura Mandiri Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontrak	
4	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar			185.289.500,00	620/29/KTR-PGWS-BM/2022, 13/06/2022	PT. Putra Aulia Konsultian	0,00	0,00	27,22	27,22	Kontrak	Penambahan Pajak 1 %
				186.973.950,00	ADD-1/620/29/KTR-PGWS-BM/2022, 14/06/2022							
B Pelebaran Jalan Menambah Lajur												
1	Pelebaran Jalan Menambah Lajur di Ruas Kubu Kerambil - Batu Sangkar (P.035)	2.414.545.155,00	2.414.452.820,49	2.236.108.023,16	620/105/KTR-BM/2022	PT. TEWANG JAYA KONSTRUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontrak	
2	Pengawasan Pelebaran Jalan Dengan Menambah Lajur	172.237.250,00	171.490.000,00	154.632.500,00	620/108/KTR-PGWS-BM/2022	PT. Putra Aulia Konsultian	0,00	0,00	0,00	0,00	Kontrak	
C Rekonstruksi Jalan												
1	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3)	2.952.106.100,00	6.900.529.664,44	2.580.420.225,38	620/52.b/KTR-BM/2022, 10/06/2022	PT. RAMA UTAMA MANDIRI	774.126.067,61	30,00	8,36	5,28	Kontrak	
2	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Malako - Abai Sangir (P.056.2)			3.519.952.632,42	620/52.a/KTR-BM/2022, 10/06/2022		1.055.985.789,75	30,00	9,33	6,34		
3	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Bts. Payakumbuh – Sitangkai (P.044)	3.452.106.100,00	3.452.058.413,69	2.897.842.164,38	620/102/KTR-BM/2022, 15/07/2022	CV. BINTANG SAGO JAYA	869.652.649,31	30,00	1,31	0,28	Kontrak	
4	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)			903.655.176,66	620/87.b/KTR-BM/2022, 04/07/2022	PT. ARPEX PRIMADHAMOR	-	-	-	-	Kontrak	
5	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Bts. Payakumbuh - Suliki – Koto Tinggi (P.069)			2.353.961.751,41	620/87.a/KTR-BM/2022, 04/07/2022		-	-	-	-		
6	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Simp. Sikabau-Simp. Koto Baru (P.010)											
7	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Singkarak - Aripan - Tanjung – Balit (P.093)			904.440.071,66	620/99/KTR-BM/2022, 27/07/2022	PT. KARYATAMA SARANA KONSTRUKSI	-	-	-	-	Kontrak	
8	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tanjung Ampalu-Sijunjung (P.008)											
9	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076) DAK	9.000.000.000,00	8.909.336.882,45	8.815.719.435,37	620/36/KTR-BM/2022, 13 Juni 2022	PT. PEBANA ADI SARANA	1.763.143.887,00	20,00	2,67	7,77	Kontrak	
10	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) (DAK)			6.211.661.343,00	620/18.a/KTR-BM/2022, 10 Juni 2022	PT. PASINDO PRIMA KREASI	1.242.332.268,00	20,00	11,11	6,58	Kontrak	
11	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101)			1.827.146.802,00	620/18.b/KTR-BM/2022, 10 Juni 2022		365.429.360,00	20,00	8,36	3,21		
12	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga) (P.038)											
13	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Rawang - Talawi (P.102)											
14	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Simp. Koto Mambang-Balingka (P.078)			1.816.248.285,59	620/96/KTR-BM/2022, 07 Juli 2022	ZAID DHARMAWANGSA WIRANATA	-	-	-	-	Kontrak	
15	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Surantiah - Kayu Aro - Langgai (P.086)	462.456.100,00	462.365.495,39	369.892.396,31	620/90/KTR-BM/2022, 29 Juni 2022	CV. TANJUNG ARYA	-	-	10,46	-	Kontrak	
16	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Palembang - Palupuh - Simp. Patai (P.081)										Persiapan Tender	
17	Rekonstruksi Jalan Penghubung Jembatan Kuranji										Persiapan Tender	
18	Pengawasan Rekonstruksi Jalan			609.235.000,00	620/24/KTR-PGWS-BM/2022, 02 Juni 2022	PT. TEKNIK EKSAKTA	-	-	16,67	15,87	Kontrak	
19	Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076) DAK			255.816.000,00	620/16/KTR-PGWS-BM/2022, 02 Juni 2022	CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT	-	-	16,67	15,03	Kontrak	

No	Uraian Kegiatan/ Pekerjaan	Pagu	HPS	Nilai Kontrak/Adendum	No./ Tanggal Kontrak & Adendum	Penyedia	Progres				Status	Keterangan
							Keuangan		Fisik			
							Realisasi	Bobot	Target	Realisasi		
8	9	10	11	12	13							
20	Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) (DAK)			254.969.000,00	620/14/KTR-PGWS-BM/2022	PT. TARU NUSANTARA	-	-	16,67	15,24	Kontrak	
D Rehabilitasi Jalan												
1	Paket 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)	18.621.000.000,00	18.574.705.531,77	17.725.049.533,85	620/03/KTR-PHJD-BM/2022, 13 April 2022	PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA	3.545.009.800,00	20,00	12,862	45,232	Kontrak	
				17.725.049.000,00	ADD-I/620/03/KTR-PHJD-BM/2022, 18 April 2022							
2	Paket 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)	17.551.500.000,00	17.471.815.172,67	17.015.545.226,64	620/06/KTR-PHJD-BM/2022, 13 April 2022	PT. BERAKIT JAYA ABADI	3.403.109.000,00	20,00	5,717	46,856	Kontrak	
				17.015.545.000,00	ADD-I/620/06/KTR-PHJD-BM/2022, 18 April 2022							
3	Paket 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)	22.472.045.455,00	22.378.897.340,97	21.251.877.013,96	620/09/KTR-PHJD-BM/2022, 19 April 2022	PT. ALCO SEJAHTERA ABADI	4.250.375.400,00	20,00	19,17	25,23	Kontrak	
				21.251.877.000,00	ADD-I/620/09/KTR-PHJD-BM/2022, 20 April 2022							
4	Paket Supervisi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)	2.500.000.000,00	2.459.221.600,00	2.312.640.000,00	620/01/KTR-PHJD-BM/2022, 13 April 2022	PT. Laras Sembada - CV. Multi Studio Engineering (KSO)	466.732.800,00	20,00	41,67	41,67	Kontrak	
				2.333.664.000,00	ADD-I/620/01/KTR-PHJD-BM/2022, 14 April 2022							
5	Survey PKRMS Jalan Provinsi Sumatera Barat	762.000.000,00	761.992.000,00	704.840.000,00	620/12/KTR-PHJD-BM/2022, 12 Mei 2022	PT. MATRA CIPTARIPTA CONSULT	-	-	21,00	21,00	Kontrak	
				711.247.000,00	ADD-I/620/12/KTR-PHJD-BM/2022							
6	Survey BMS Jalan Propinsi Sumatera Barat	321.000.000,00	320.999.250,00	287.430.000,00	620/14/KTR-PHJD-BM/2022, 12 Mei 2022	CV. DIMIANO KONSULTAN	-	-	23,00	23,00	Kontrak	
				290.043.000,00	ADD-I/620/14/KTR-PHJD-BM/2022							
F Pemeliharaan Berkala Jalan												
1	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Baso - Batusangkar (P.036)	900.000.000,00	900.000.000,00	822.380.083,45	620/71.b/KTR-BM/2022, 15 Juni 2022	PT. TRI JAYA PUTRA	164.476.022,28	20,00	3,69	1,85	Kontrak	
2	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Batusangkar - Ombilin (P.070) DAK	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	5.138.871.405,36	620/71.a/KTR-BM/2022, 15 Juni 2022	PT. TRI JAYA PUTRA	1.079.987.600,00	20,00	1,39	0,88	Kontrak	
				5.399.938.000,00	ADD-I/620/71.a/KTR-BM/2022, 27 Juni 2022							
3	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025)	2.800.000.000,00	2.799.996.537,41	2.464.443.994,43	620/68/KTR-BM/2022, 15 Juni 2022	PT. ANUGRAH TRIPA RAYA	492.888.700,00	20,00	2,97	7,70	Kontrak	
4	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Panti - Simp. Empat (P.031)	4.078.065.450,00	4.078.064.903,75	3.914.985.000,00	620/65/KTR-BM/2022, 14 Juni 2022	PT. HARYONA	782.997.000,00	20,00	2,76	1,28	Kontrak	
5	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Panti - Simp. Empat (P.031) DAK	5.700.891.000,00	5.700.871.149,10	5.114.998.215,00	620/78/KTR-BM/2022, 15 Juni 2022	PT. ARTHA BUMI ANDALAS	1.022.999.643,00	20,00	1,52	11,46	Kontrak	
				5.626.498.000,00	ADD-I/620/78/KTR-BM/2022, 27 Juni 2022							
6	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Simpang Empat - Sasak (P.033)	190.000.000,00									Proses Pengadaan	Penyusunan HPS
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Simp. Baso Piladang (P.079) DAK	8.400.000.000,00	8.399.978.712,97	7.887.227.746,48	620/81/KTR-BM/2022, 15 Juni 2022	PT. LASKAR MUDA GEMILANG	1.577.445.549,30	20,00	2,13	7,04	Kontrak	
				8.399.945.000,00	6ADD-I/20/81/KTR-BM/2022, 27 Juni 2022							
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101)	190.000.000,00									Proses Pengadaan	Penyusunan HPS
9	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Sicincin - Kurai Taji (P.028)	190.000.000,00									Menunggu APBD Perubahan	Untuk Pergantian Kode Rekening Belanja
10	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan	126.136.645,00	126.120.500,00	117.562.500,00	620/76/KTR-PGWS-BM/2022, 15 Juni 2022	PT. RAISSA GEMILANG			29,02	29,02	Kontrak	
11	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Batusangkar - Ombilin (P.070) DAK	235.000.000,00	234.592.600,00	216.304.000,00	620/31/KTR-PGWS-BM/2022, 2 Juni 2022	KARAHOSHITAMA ENGINEERING			9,36	9,36	Kontrak	
				218.270.400,00	ADD-I/620/31/KTR-PGWS-BM/2022, 3 Juni 2022							

No	Uraian Kegiatan/ Pekerjaan	Pagu	HPS	Nilai Kontrak/Adendum	No./ Tanggal Kontrak & Adendum	Penyedia	Progres				Status	Keterangan
							Keuangan		Fisik			
							Realisasi	Bobot	Target	Realisasi		
8	9	10	11	12	13							
12	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Panti - Simp. Empat (P.031) DAK	235.000.000,00	234.592.600,00	216.194.000,00	620/74/KTR-PGWS-BM/2022, 2 Juni 2022	CV. KARAHOSHITAMA ENGINEERING			9,14	9,14	Kontrak	
			234.698.400,00	ADD-II620/74KTR-PGWS-BM/2022, 22 Juni 2022								
13	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Simp. Baso - Piladang (P.079) DAK	250.000.000,00	249.304.550,00	221.182.500,00	620/55/KTR-PGWS-BM/2022, 2 Juni 2022	CV. MISUDA ENGINEERING CONSULTANT			7,45	7,45		
			242.562.750,00	ADD-II/620/55/KTR-PGWS-BM/2022, 22 Juni 2022								
G Pembangunan Jembatan												
1	Pembangunan Jembatan Akses RS.UNAND											
2	Pengawasan Pembangunan Jembatan Provinsi											
H Penggantian Jembatan												
1	Penggantian Jembatan Bt.Namang (P.069.2)	4.726.293.806,00	4.710.980.526,02	3.768.784.772,84	630/84/KTR-BM/2022, 15 Juni 2022	CV. METRONAS	1.130.635.431,00	30,00	2,83	3,05	Kontrak	
2	Penggantian Jembatan Kayu Aro (P.071)	3.925.789.744,00	3.027.328.195,54	2.366.819.497,90	630/41/KTR-BM/2022, 13 Juni 2022	CV. MULTI USAHA PRADANA	710.045.700,00	30,00	7,97	6,51	Kontrak	
				2.366.819.000,00	ADD-I/630/41/KTR-BM/2022, 14 Juni 2022							
3	Pengawasan Penggantian Jembatan Provinsi	134.664.953,00	134.663.100,00	132.715.000,00	630/39/KTR-PGWS-BM/2022, 13 Juni 2022	PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT			22,22	22,22	Kontrak	
				133.921.500,00	ADD-I/630/39/KTR-PGWS-BM/2022, 14 Juni 2022							
I Rehabilitasi Jembatan												
1	Rehabilitasi dan Pengecatan Jembatan Sunur	176.000.000,00									Belum Tender	Penyusunan HPS
2	Rehabilitasi Jembatan di Ruas Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	175.891.700,00									Belum Tender	Penyusunan HPS
3	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Provinsi	24.969.413,00									Belum Tender	Penyusunan HPS
J Pembangunan Jalan												
1	Pembangunan Jalan Bukittinggi - Gaduik - Pincuran	2.500.000.000,00	2.499.924.772,26								Proses Pengadaan	Penyusunan HPS
2	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Duku Sicincin (P.087)	500.100.000,00	500.050.904,39	400.040.859,52	620/47/KTR-BM/2022 13 Juni 2022	CV. Bukit Berlian Konstruksi	120.012.257,86	30,00	19,95	60,19	Kontrak	
				400.040.859,52	ADD-I/620/47/KTR-BM/2022 14 Juni 2022							
3	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104)	1.774.191.875,00	1.610.023.540,28	1.289.460.690,72	620/21/KTR-BM/2022 10 Juni 2022	CV. Insani Kontraktor	386.838.207,22	30,00	1,82	2,53	Kontrak	
				1.289.460.690,72	ADD-I/620/21/KTR-BM/2022, 13 Juni 2022							
4	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Sikaping - Talu (P.096)	4.700.000.000,00	4.699.999.155,14	4.393.995.000,00	620/60/KTR-BM/2022, 2022	PT. Teguh Karya Rahardjo	878.799.000,00	20,00	6,63	4,17	Kontrak	
5	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Palupuh - Puagadih - Koto Tinggi (P.090)	700.000.000,00	699.983.185,18	608.369.080,00	620/44/KTR-BM/2022, 13 Juni 2022	CV. Mitra Dua Muda	182.510.724,00	30,00	4,97	2,07	Kontrak	
				608.369.080,00	Add-I/620/44/KTR-BM/2022, 13 Juni 2022							
6	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK	16.801.247.000,00	16.575.429.209,72	14.791.430.993,79	620/57/KTR-BM/2022, 2022	PT. TRI JAYA PUTRA	3.254.114.800,00	20,00	1,44	14,37	Kontrak	
				16.270.574.000,00	ADD-I/620/57/KTR-BM/2022, 27 Juni 2022							
7	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (TPA Regional) (P.085)	200.000.000,00	199.961.575,91								Proses Pengadaan	Penyusunan HPS
8	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK	400.000.000,00	399.867.600,00	359.605.950,00	620/50/KTR-PGWS-BM/2022, 02 Juni 2022	PT. Triartha Nusa Engineering	74.363.160,00	20,00	22,70	22,70	Kontrak	
				371.815.800,00	ADD-I/620/50/KTR-PGWS-BM/2022, 15 Juni 2022							
9	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi	299.392.464,00	298.802.350,00	247.165.050,00	620/63/KTR-PGWS-BM/2022, 14 Juni 2022	CV. Vitech Pratama Consultant			33,16	33,16	Kontrak	
				249.412.005,00	ADD-I/620/63/KTR-PGWS-BM/2022, 14 Juni 2022							

No	Uraian Kegiatan/ Pekerjaan	Pagu	HPS	Nilai Kontrak/Adendum	No./ Tanggal Kontrak & Adendum	Penyedia	Progres				Status	Keterangan
							Keuangan		Fisik			
							Realisasi	Bobot	Target	Realisasi		
8	9	10	11	12	13							
K	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan											
1	Paket Core Team Perencanaan dan Pendampingan Teknis Bina Marga			878.331.900,00	620/13/KTR-PPK.01-BM/2022, 18 Juli 2022	PT. WASTU ANOPAMA	-	-	-	-	Kontrak	
2	Paket Penyusunan DED Jalan Bonjol-Suliki											Kegiatan Dibatalkan
3	Paket Penyusunan DED Jalan Sasak - Maliki			349.122.750,00	ADD-I/620/07/KTR-PRC-BM/2022, 11 Mei 2022	PT. INDONESIA CONSULTAN TEKNIK	104.736.825,00	30,00	75,00	50,00	Kontrak	
4	Paket Penyusunan DED Jalan Simpang Tenggo - Madina (Bts. Sumut)											Kegiatan Dibatalkan
5	Paket Penyusunan DED Jalan Terban Guguk Cino - Sawahlunto (Lap. Segitiga) (P.038)											Sudah Masuk Dalam Core Team
6	Paket Penyusunan DED Jalan Unggan - Pamusian			348.900.750,00	ADD-I/620/05/KTR-PRC-BM/2022, 11 Mei 2022	PT. INDONESIA CONSULTAN TEKNIK	104.670.225,00	30,00	75,00	50,00	Kontrak	
7	Paket Penyusunan DED Pengaman Tebing Ruas Jalan Simp. Koto Mambang - Balingka (P.078)											Sudah Masuk Dalam Core Team
8	Paket Penyusunan Review DED Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) yang melewati Kawasan TM Tarusan Arau Hilir			84.926.100,00	620/02/KTR-PRC-BM/2022, Maret 2022	7 PT. PUTRA AULIA KONSULTAN	84.926.100,00	100,00	100,00	100,00	Selesai Kontrak	Sudah PHO
9	Paket Penyusunan DED Jembatan Bateh (P.071)											Kegiatan Dibatalkan
10	Paket Penyusunan DED Jembatan di Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan (P.068)											Sudah Masuk Dalam Core Team
11	Paket Penyusunan DED Jembatan Sungai Panjang Indah (P.076)											Kegiatan Dibatalkan
12	Paket Penyusunan DED Jembatan Ujung Tengah (P.056,3)											Sudah Masuk Dalam Core Team
13	Paket Penyusunan DED Rehab Berat Jembatan Provinsi											Sudah Masuk Dalam Core Team
14	Paket Penyusunan Dokling Jalan Bonjol-Suliki			712.398.000,00		PT. ALAM LESTARI KONSULTAN					Persiapan Kontrak	
15	Paket Penyusunan Dokling Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082) Segmen III											Kegiatan Dibatalkan
16	Paket Penyusunan Dokling Jalan Bukittinggi By Pass - Pasar Amor											Kegiatan Dibatalkan
17	Paket Penyusunan Dokling Jembatan Akses RS Unand			99.250.840,92	620/09/KTR-PRC-BM/2022, 11 Mei 2022	CV. NABIEL ENGINEERING CONSULTANT	99.250.840,92	100,00	100,00	100,00	Selesai Kontrak	Sudah PHO



DOKUMENTASI PEKERJAAN

PAKET 1 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI DI KSPN MANDEH (PHJD TAHAP III)



DOKUMENTASI PEKERJAAN

PAKET 2 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI DI KSPN MANDEH (PHJD TAHAP III)

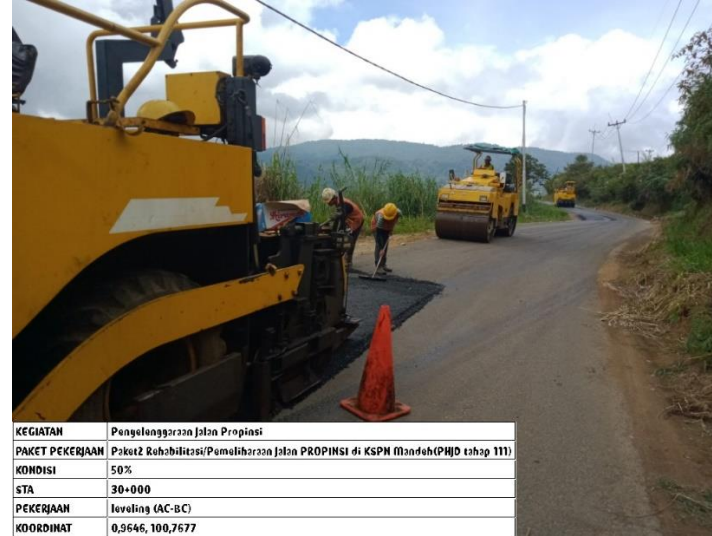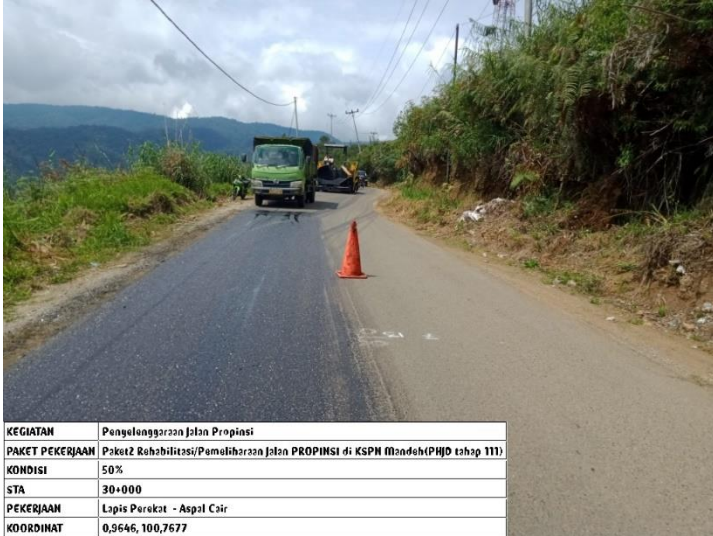


DOKUMENTASI PEKERJAAN

PAKET 3 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI DI KSPN MANDEH (PHJD TAHAP III)



Pekerjaan	Paket 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi diKSPN Mandeh (PHJD Tahap III)
Ruas Jalan	Simp.(Duku Ketaping)-Pariaman (P.075)
Item Pekerjaan	Pengendalian Tanaman
Sta	0+000
Kondisi	50%

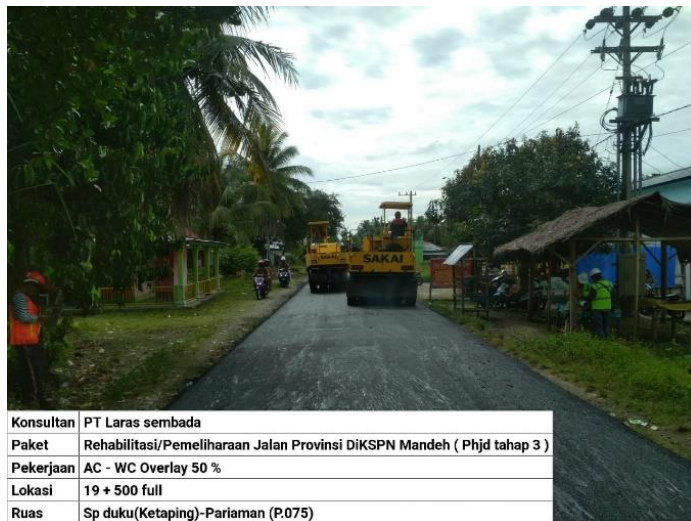

Konsultan	PT Laras sembada
Paket	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi DiKSPN Mandeh (Phjd tahap 3)
Pekerjaan	AC - WC Overlay 50 %
Lokasi	19 + 500 full
Ruas	Sp duku(Ketaping)-Pariaman (P.075)



