

No	Uraian Kegiatan/ Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak/Adendum	No./ Tanggal Kontrak & Adendum	Penyedia	Progres				Status	Keterangan
						Keuangan		Fisik			
						Realisasi	Bobot	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A Pelebaran Jalan Menuju Standar											
1	Pelebaran Jalan Menuju Standar di Ruas Padang Koto Gadang -Palembayan (P.088)	4.939.982.400,00	4.755.744.303,01	620/26/KTR-PGWS-BM/2022, 13/06/2022	PT. Aura Mandiri Sejahtera	951.148.860,60	20,00	43,131	39,138	Kontrak	
2	Pelebaran Jalan Menuju Standar di ruas Sp. Ganting Payo – Batas Tanah Datar – Sumani (P.092)	1.956.232.400,00	1.868.218.442,88	620/110/KTR-PGWS-BM/2022, 22/07/2022	PT. Dapindo Pratama	373.643.688,58	20,00	24,36	24,50	Kontrak	
3	Pelebaran Jalan Menuju Standar di Ruas Padang Sawah -Kumpulan (P.068)	4.071.773.600,00	3.715.216.138,85	620/113/KTR-PGWS-BM/2022, 26/07/2022	PT. Aura Mandiri Sejahtera	743.043.227,77	20,00	24,44	24,56	Kontrak	
4	Pengawasan Pelebaran Jalan Menuju Standar	210.182.400,00	185.289.500,00 186.973.950,00	620/29/KTR-PGWS-BM/2022, 13/06/2022 ADD-I/620/29/KTR-PGWS-BM/2022, 14/06/2022	PT. Putra Aulia Konsultan	0,00	0,00	61,11	61,11	Kontrak	Penambahan Pajak 1 %
B Pelebaran Jalan Menambah Lajur											
1	Pelebaran Jalan Menambah Lajur di Ruas Kubu Kerambil - Batu Sangkar (P.035)	2.414.545.155,00	2.236.108.023,16	620/105/KTR-BM/2022	PT. TEWANG JAYA KONSTRUKSI	447.221.604,63	20,00	35,55	1,22	Kontrak	
2	Pengawasan Pelebaran Jalan Dengan Menambah Lajur	172.237.250,00	154.632.500,00	620/108/KTR-PGWS-BM/2022	PT. Putra Aulia Konsultan	0,00	0,00	50,00	50,00	Kontrak	
C Rekonstruksi Jalan											
1	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3)	2.952.106.100,00	2.580.420.225,38	620/52.b/KTR-BM/2022, 10/06/2022	PT. RAMA UTAMA MANDIRI	774.126.067,61	30,00	47,01	20,16	Kontrak	
2	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Malako - Abai Sangir (P.056.2)		3.519.952.632,42	620/52.a/KTR-BM/2022, 10/06/2022		1.055.985.789,75	30,00	45,05	7,20		
3	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Bts. Payakumbuh – Sitangkai (P.044)	3.452.106.100,00	2.897.842.164,38	620/102/KTR-BM/2022, 15/07/2022	CV. BINTANG SAGO JAYA	869.652.649,31	30,00	36,95	11,41	Kontrak	
4	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)		903.655.176,66	620/87.b/KTR-BM/2022, 04/07/2022	PT. ARPEX PRIMADHAMOR	-	-	94,83	97,59	Kontrak	
5	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Bts. Payakumbuh - Suliki – Koto Tinggi (P.069)		2.353.961.751,41	620/87.a/KTR-BM/2022, 04/07/2022		-	-	11,48	8,14		
6	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Simp. Sikabau-Simp. Koto Baru (P.010)				PT. BERAKIT JAYA ABADI	562.201.495,14	20,00	37,42	22,47	Kontrak	
7	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Singkarak - Arian - Tanjung – Balit (P.093)		904.440.071,66	620/99/KTR-BM/2022, 27/07/2022	PT. KARYATAMA SARANA KONSTRUKSI	180.888.000,00	20,00	20,20	10,39	Kontrak	
8	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tanjung Ampalu-Sijunjung (P.008)				PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA	7.158.932.543,89	63,71	53,19	85,67	Kontrak	
9	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076) DAK	9.000.000.000,00	8.815.719.435,37	620/36/KTR-BM/2022, 13 Juni 2022	PT. PEBANA ADI SARANA	1.763.143.887,00	20,00	45,16	54,36	Kontrak	
10	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) (DAK)		6.211.661.343,00	620/18.a/KTR-BM/2022, 10 Juni 2022	PT. PASINDO PRIMA KREASI	1.839.797.268,00	27,90	50,63	42,09	Kontrak	
11	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101)		1.827.146.802,00	620/18.b/KTR-BM/2022, 10 Juni 2022		798.741.110,00	40,74	53,41	83,90		
12	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga) (P.038)				PT. KHOHIL BROTHER'S (KOBEGROUP)	512.216.746,19	20,00	25,94	6,30	Kontrak	
13	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Rawang - Talawi (P.102)									Kegiatan ditunda menunggu Perubahan APBD 2022 karena ada penambahan dana	PL
14	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Simp. Koto Mambang-Balingka (P.078)		1.816.248.285,59	620/96/KTR-BM/2022, 07 Juli 2022	ZAID DHARMAWANGSA WIRANATA	454.062.071,40	25,00	40,07	-	Kontrak	
15	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Surantiah - Kayu Aro - Langgai (P.086)	462.456.100,00	369.892.396,31	620/90/KTR-BM/2022, 29 Juni 2022	CV. TANJUNG ARYA	110.967.718,89	30,00	49,03	49,00	Kontrak	

No	Uraian Kegiatan/ Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak/Adendum	No./ Tanggal Kontrak & Adendum	Penyedia	Progres				Status	Keterangan	
						Keuangan		Fisik				
						Realisasi	Bobot	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Palembang - Palupuh - Simp. Patai (P.081)										Dalam Proses PL	PL
17	Rekonstruksi Jalan Penghubung Jembatan Kuranji										Dibatalkan (Bukan kewenangan provinsi, dana dialihkan ke rekonstruksi jalan Sungai Limau - Lubuk Basung)	PL
18	Pengawasan Rekonstruksi Jalan		609.235.000,00	620/24/KTR-PGWS-BM/2022, 02 Juni 2022	PT. TEKNIK EKSAKTA	-	-	50,00	51,47		Kontrak	
19	Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076) DAK		255.816.000,00	620/16/KTR-PGWS-BM/2022, 02 Juni 2022	CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT	-	-	50,00	50,98		Kontrak	
20	Pengawasan Rekonstruksi Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101) (DAK)		254.969.000,00	620/14/KTR-PGWS-BM/2022	PT. TARU NUSANTARA	141.466.534,54	54,98	50,00	52,21		Kontrak	
D Rehabilitasi Jalan												
1	Paket 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)	18.621.000.000,00	17.725.049.533,85	620/03/KTR-PHJD-BM/2022, 13 April 2022	PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA	9.552.274.300,00	53,89	67,393	67,412	Kontrak		
			17.725.049.000,00	ADD-I/620/03/KTR-PHJD-BM/2022, 18 April 2022								
2	Paket 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)	17.551.500.000,00	17.015.545.226,64	620/06/KTR-PHJD-BM/2022, 13 April 2022	PT. BERAKIT JAYA ABADI	9.357.347.000,00	54,99	71,754	67,001	Kontrak		
			17.015.545.000,00	ADD-I/620/06/KTR-PHJD-BM/2022, 18 April 2022								
3	Paket 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)	22.472.045.455,00	21.251.877.013,96	620/09/KTR-PHJD-BM/2022, 19 April 2022	PT. ALCO SEJAHTERA ABADI	8.240.394.900,00	38,77	51,06	55,29	Kontrak		
			21.251.877.000,00	ADD-I/620/09/KTR-PHJD-BM/2022, 20 April 2022								
4	Paket Supervisi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III)	2.500.000.000,00	2.312.640.000,00	620/01/KTR-PHJD-BM/2022, 13 April 2022	PT. Laras Sembada - CV. Multi Studio Engineering (KSO)	1.038.378.360,00	44,50	69,17	69,17	Kontrak		
			2.333.664.000,00	ADD-I/620/01/KTR-PHJD-BM/2022, 14 April 2022								
5	Survey PKRMS Jalan Provinsi Sumatera Barat	762.000.000,00	704.840.000,00	620/12/KTR-PHJD-BM/2022, 12 Mei 2022	PT. MATRA CIPTARIPTA CONSULT	-	-	55,00	95,00	Kontrak		
			711.247.000,00	ADD-I/620/12/KTR-PHJD-BM/2022								
6	Survey BMS Jalan Propinsi Sumatera Barat	321.000.000,00	287.430.000,00	620/14/KTR-PHJD-BM/2022, 12 Mei 2022	CV. DIMIANO KONSULTAN	-	-	100,00	100,00	Kontrak		
			290.043.000,00	ADD-I/620/14/KTR-PHJD-BM/2022								
F Pemeliharaan Berkala Jalan												
1	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Baso - Batusangkar (P.036)	900.000.000,00	822.380.083,45	620/71.b/KTR-BM/2022, 15 Juni 2022	PT. TRI JAYA PUTRA	164.476.022,28	20,00	100,00	100,00	Kontrak		
2	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Batusangkar - Ombilin (P.070) DAK	5.400.000.000,00	5.138.871.405,36	620/71.a/KTR-BM/2022, 15 Juni 2022	PT. TRI JAYA PUTRA	1.079.987.600,00	20,00	68,43	83,40	Kontrak		
			5.399.938.000,00	ADD-I/620/71.a/KTR-BM/2022, 27 Juni 2022								
3	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Manggopoh - Padang Luar (P.025)	2.800.000.000,00	2.464.443.994,43	620/68/KTR-BM/2022, 15 Juni 2022	PT. ANUGRAH TRIPA RAYA	1.569.286.992,00	57,89	88,13	88,31	Kontrak		
4	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Panti - Simp. Empat (P.031)	4.078.065.450,00	3.914.985.000,00	620/65/KTR-BM/2022, 14 Juni 2022	PT. HARIYONA	782.997.000,00	20,00	59,97	56,51	Kontrak		
5	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Panti - Simp. Empat (P.031) DAK	5.700.891.000,00	5.114.998.215,00	620/78/KTR-BM/2022, 15 Juni 2022	PT. ARTHA BUMI ANDALAS	1.590.994.593,00	28,28	84,94	86,44	Kontrak		
			5.626.498.000,00	ADD-I/620/78/KTR-BM/2022, 27 Juni 2022								
6	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Simpang Empat - Sasak (P.033)	190.000.000,00	187.081.000,00	620/122/SPK-BM/2022, 5 September 2022	CV. Anak Asyik Pratama	93.540.500,00	50,00	23,50	25,54	Kontrak		

No	Uraian Kegiatan/ Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak/Adendum	No./ Tanggal Kontrak & Adendum	Penyedia	Progres				Status	Keterangan
						Keuangan		Fisik			
						Realisasi	Bobot	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Simp.Baso-Piladang (P.079) DAK	8.400.000.000,00	7.887.227.746,48	620/81/KTR-BM/2022, 15 Juni 2022	PT. LASKAR MUDA GEMILANG	2.308.603.299,30	27,48	63,76	60,05	Kontrak	
			8.399.945.000,00	6ADD-I/20/81/KTR-BM/2022, 27 Juni 2022							
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Tapus - Muaro Sei.Lolo - Gelugur (P.101)	190.000.000,00	187.626.000,00	620/125/SPK-BM/2022, 12 September 2022	CV. RD Group			13,07	10,45	Kontrak	
9	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Sicincin - Kurai Taji (P.028)	190.000.000,00								Menunggu APBD Perubahan	Untuk Pergantian Kode Rekening Belanja
10	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan	126.136.645,00	117.562.500,00	620/76/KTR-PGWS-BM/2022, 15 Juni 2022	PT. RAISSA GEMILANG			84,95	84,95	Kontrak	
11	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Batusangkar - Ombilin (P.070) DAK	235.000.000,00	216.304.000,00	620/31/KTR-PGWS-BM/2022, 2 Juni 2022	CV. KARAHOSHITAMA ENGINEERING	76.076.570,00	34,85	84,37	84,37	Kontrak	
			218.270.400,00	ADD-I/620/31/KTR-PGWS-BM/2022, 3 Juni 2022							
12	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Panti - Simp. Empat (P.031) DAK	235.000.000,00	216.194.000,00	620/74/KTR-PGWS-BM/2022, 2 Juni 2022	CV. KARAHOSHITAMA ENGINEERING			83,93	83,93	Kontrak	
			234.698.400,00	ADD-II620/74KTR-PGWS-BM/2022, 22 Juni 2022							
13	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi di Ruas Simp.Baso - Piladang (P.079) DAK	250.000.000,00	221.182.500,00	620/55/KTR-PGWS-BM/2022, 2 Juni 2022	CV. MISUDA ENGINEERING CONSULTANT	48.512.550,00	20,00	69,54	69,54	Kontrak	
			242.562.750,00	ADD-II/620/55/KTR-PGWS-BM/2022, 22 Juni 2022							
G Pembangunan Jembatan											
1	Pembangunan Jembatan Akses RS.UNAND										Dana dialihkan untuk pengadaan rangka jembatan Akses RS. Unand pada APBD-P 2022
2	Pengawasan Pembangunan Jembatan Provinsi										Dana dialihkan untuk pengadaan rangka jembatan Akses RS. Unand pada APBD-P 2022
H Penggantian Jembatan											
1	Penggantian Jembatan Bt.Namang (P.069.2)	4.726.293.806,00	3.768.784.772,84	630/84/KTR-BM/2022, 15 Juni 2022	CV. METRONAS	2.078.170.689,47	50,13	32,96	44,31	Kontrak	
			4.145.663.250,00	ADD-I/630/84/KTR-BM/2022, 4 Agustus 2022							
2	Penggantian Jembatan Kayu Aro (P.071)	3.925.789.744,00	2.366.819.497,90	630/41/KTR-BM/2022, 13 Juni 2022	CV. MULTI USAHA PRADANA	1.346.077.950,00	51,73	30.823,00	50,33	Kontrak	
			2.602.232.000,00	ADD-II/630/41/KTR-BM/2022, 4 Agustus 2022							
3	Pengawasan Penggantian Jembatan Provinsi	134.664.953,00	132.715.000,00	630/39/KTR-PGWS-BM/2022, 13 Juni 2022	BT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT			59,44	59,44	Kontrak	
			133.921.500,00	ADD-I/630/39/KTR-PGWS-BM/2022, 14 Juni 2022							
I Rehabilitasi Jembatan											
1	Rehabilitasi dan Pengecatan Jembatan Sunur	176.000.000,00								Menunggu APBD Perubahan	Untuk Pergantian Kode Rekening Belanja
2	Rehabilitasi Jembatan di Ruas Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	175.891.700,00								Menunggu APBD Perubahan	Untuk Pergantian Kode Rekening Belanja
3	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Provinsi	24.969.413,00								Menunggu APBD Perubahan	Untuk Pergantian Kode Rekening Belanja

No	Uraian Kegiatan/ Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak/Adendum	No./ Tanggal Kontrak & Adendum	Penyedia	Progres				Status	Keterangan
						Keuangan		Fisik			
						Realisasi	Bobot	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
J Pembangunan Jalan											
1	Pembangunan Jalan Bukittinggi - Gaduik - Pincuran	2.500.000.000,00	2.335.926.735,00	620/116/KTR-BM/2022, 2 September 2022	PT. SURYA RAFLI MANDIRI			1,44	1,88	Kontrak	
2	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Duku Sicincin (P.087)	500.100.000,00	400.040.859,52 400.040.859,52	620/47/KTR-BM/2022 13 Juni ADD-I/620/47/KTR-BM/2022 14 Juni 2022	CV. Bukit Berlian Konstruksi	276.545.257,86	69,13	100,00	100,00	Kontrak	PHO Tgl. 12 September 2022
3	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104)	1.774.191.875,00	1.289.460.690,72 1.289.460.690,72	620/21/KTR-BM/2022 10 Juni ADD-I/620/21/KTR-BM/2022, 13 Juni 2022	CV. Insani Kontraktor	675.249.207,22	47,16	49,12	63,38	Kontrak	
4	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Sikaping - Talu (P.096)	4.700.000.000,00	4.393.995.000,00	620/50/KTR-BM/2022, 15 Juni 2022	PT. Teguh Karya Rahardjo	878.799.000,00	20,00	29,67	25,34	Kontrak	
5	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Palupuh - Puagadit - Koto Tinggi (P.090)	700.000.000,00	608.369.080,00 608.369.080,00	620/44/KTR-BM/2022, 13 Juni 2022 Add-I/620/44/KTR-BM/2022, 13 Juni 2022	CV. Mitra Dua Muda	182.510.724,00	30,00	77,65	83,02	Kontrak	
6	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK	16.801.247.000,00	14.791.430.993,79 16.270.574.000,00	620/57/KTR-BM/2022, 14 Juni 2022 ADD-I/620/57/KTR-BM/2022, 27 Juni 2022	PT. TRI JAYA PUTRA	3.254.114.800,00	20,00	17,57	35,93	Kontrak	
7	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (TPA Regional) (P.085)	200.000.000,00	197.743.449,76	620/119/KTR-BM/2022, 25 Agustus 2022	CV. SEHATI					Kontrak	
8	PengawasanPembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK	400.000.000,00	359.605.950,00 371.815.800,00	620/50/KTR-PGWS-BM/2022, 02 Juni 2022 ADD-I/620/50/KTR-PGWS-BM/2022, 15 Juni 2022	PT. Triartha Nusa Engineering	74.363.160,00	20,00	55,90	55,90	Kontrak	
9	Pengawasan Pembangunan Jalan Provinsi	299.392.464,00	247.165.050,00 249.412.005,00	620/63/KTR-PGWS-BM/2022, 14 Juni 2022 ADD-I/620/63/KTR-PGWS-BM/2022, 14 Juni 2022	CV. Vitech Pratama Consultant	-	-	75,51	75,51	Kontrak	
K Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan											
1	Paket Core Team Perencanaan dan Pendampingan Teknis Bina Marga	889.989.600,00	878.331.900,00	620/13/KTR-PPK.01-BM/2022, 18 Juli 2022	PT. WASTU ANOPAMA	263.499.570,00	30,00	40,00	40,00	Kontrak	
2	Paket Penyusunan DED Jalan Bonjol-Suliki	749.994.800,00									Kegiatan Dibatalkan
3	Paket Penyusunan DED Jalan Sasak - Maliki	364.365.000,00	349.122.750,00	ADD-I/620/07/KTR-PRC-BM/2022, 11 Mei 2022	PT. INDONESIA CONSULTAN TEKNIK	104.736.825,00	30,00	100,00	75,00	Kontrak	
4	Paket Penyusunan DED Jalan Simpang Tenggo - Madina (Bts. Sumut)										Kegiatan Dibatalkan
5	Paket Penyusunan DED Jalan Terban Guguk Cino - Sawahlunto (Lap. Segitiga) (P.038)										Sudah Masuk Dalam Core Team
6	Paket Penyusunan DED Jalan Unggan - Pamusian	364.365.000,00	348.900.750,00	ADD-I/620/05/KTR-PRC-BM/2022, 11 Mei 2022	PT. INDONESIA CONSULTAN TEKNIK	104.670.225,00	30,00	100,00	75,00	Kontrak	
7	Paket Penyusunan DED Pengaman Tebing Ruas Jalan Simp. Koto Mambang - Balingka (P.078)										Sudah Masuk Dalam Core Team
8	Paket Penyusunan Review DED Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) yang melewati Kawasan TM Tarusan Arau Hilir	85.000.000,00	84.926.100,00	620/02/KTR-PRC-BM/2022, 7 Maret 2022	PT. PUTRA AULIA KONSULTAN	84.926.100,00	100,00	100,00	100,00	Selesai Kontrak	Sudah PHO
9	Paket Penyusunan DED Jembatan Bateh (P.071)										Kegiatan Dibatalkan
10	Paket Penyusunan DED Jembatan di Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan (P.068)										Sudah Masuk Dalam Core Team
11	Paket Penyusunan DED Jembatan Sungai Panjang Indah (P.076)										Kegiatan Dibatalkan
12	Paket Penyusunan DED Jembatan Ujung Tengah (P.056,3)										Sudah Masuk Dalam Core Team

No	Uraian Kegiatan/ Pekerjaan	Pagu	Nilai Kontrak/Adendum	No./ Tanggal Kontrak & Adendum	Penyedia	Progres				Status	Keterangan	
						Keuangan		Fisik				
						Realisasi	Bobot	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	Paket Penyusunan DED Rehab Berat Jembatan Provinsi											Sudah Masuk Dalam Core Team
14	Paket Penyusunan Dokling Jalan Bonjol-Suliki	749.994.800,00	712.398.000,00	620/20/KTR-PPK.01-BM/2022, 1 Agustus 2022	PT. ALAM LESTARI KONSULTAN			30,00	10,00	Kontrak		
15	Paket Penyusunan Dokling Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082) Segmen III											Kegiatan Dibatalkan
16	Paket Penyusunan Dokling Jalan Bukittinggi By Pass - Pasar Amor	361.543.834,00										Kegiatan Dibatalkan
17	Paket Penyusunan Dokling Jembatan Akses RS Unand	99.443.850,00	99.250.840,92	620/09/KTR-PRC-BM/2022, 11 Mei 2022	CV. NABIEL ENGINEERING CONSULTANT	99.250.840,92	100,00	100,00	100,00	Selesai Kontrak		Sudah PHO


DOKUMENTASI PEKERJAAN

PAKET 1 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI DI KSPN MANDEH (PHJD TAHAP III)



DOKUMENTASI PEKERJAAN

PAKET 2 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI DI KSPN MANDEH (PHJD TAHAP III)

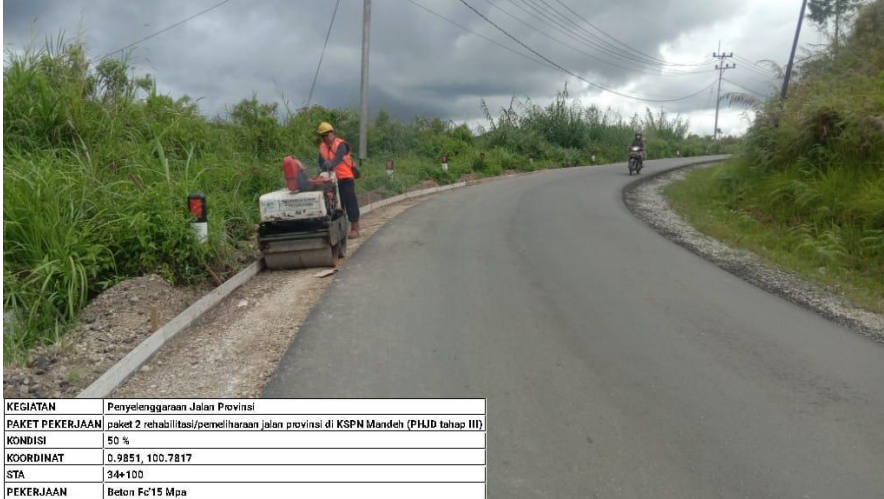

KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
PAKET PEKERJAAN	paket 2 rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi di KSPN Mandeh (PHJD tahap III)
KONDISI	50 %
KOORDINAT	0.9851, 100.7817
STA	34+100
PEKERJAAN	Beton Fc'15 Mpa



KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
PAKET PEKERJAAN	paket 2 rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi di KSPN Mandeh (PHJD tahap III)
KONDISI	50 %
KOORDINAT	0.9851, 100.7817
STA	34+100
PEKERJAAN	Beton Fc'15 Mpa



DOKUMENTASI PEKERJAAN

PAKET 3 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI DI KSPN MANDEH (PHJD TAHAP III)

